

Flujo de requisiciones de material

Diagrama de proceso de principio a fin, por rol y por operación



QUÉ CUBRE

Desde que la obra pide material hasta que la requisición se cierra, incluyendo la compra al proveedor cuando la bodega no tiene stock.

CUATRO ROLES

Encargado de obra, bodeguero, recepción y compras, y gerencia. Cada carril del diagrama muestra qué le toca a cada uno.

DOS CAMINOS


Vía bodega (sale de nuestro inventario) y vía compra directa (el proveedor entrega en la obra). No se comportan igual.

FUENTE

Extraído del código en producción: enum de estados, servicios de transición y matriz de permisos del seeder de roles.


MAPA DE ESTADOS · las nueve situaciones posibles de una requisición

El estado solo avanza. La única marcha atrás la produce anular la compra que la surtió.

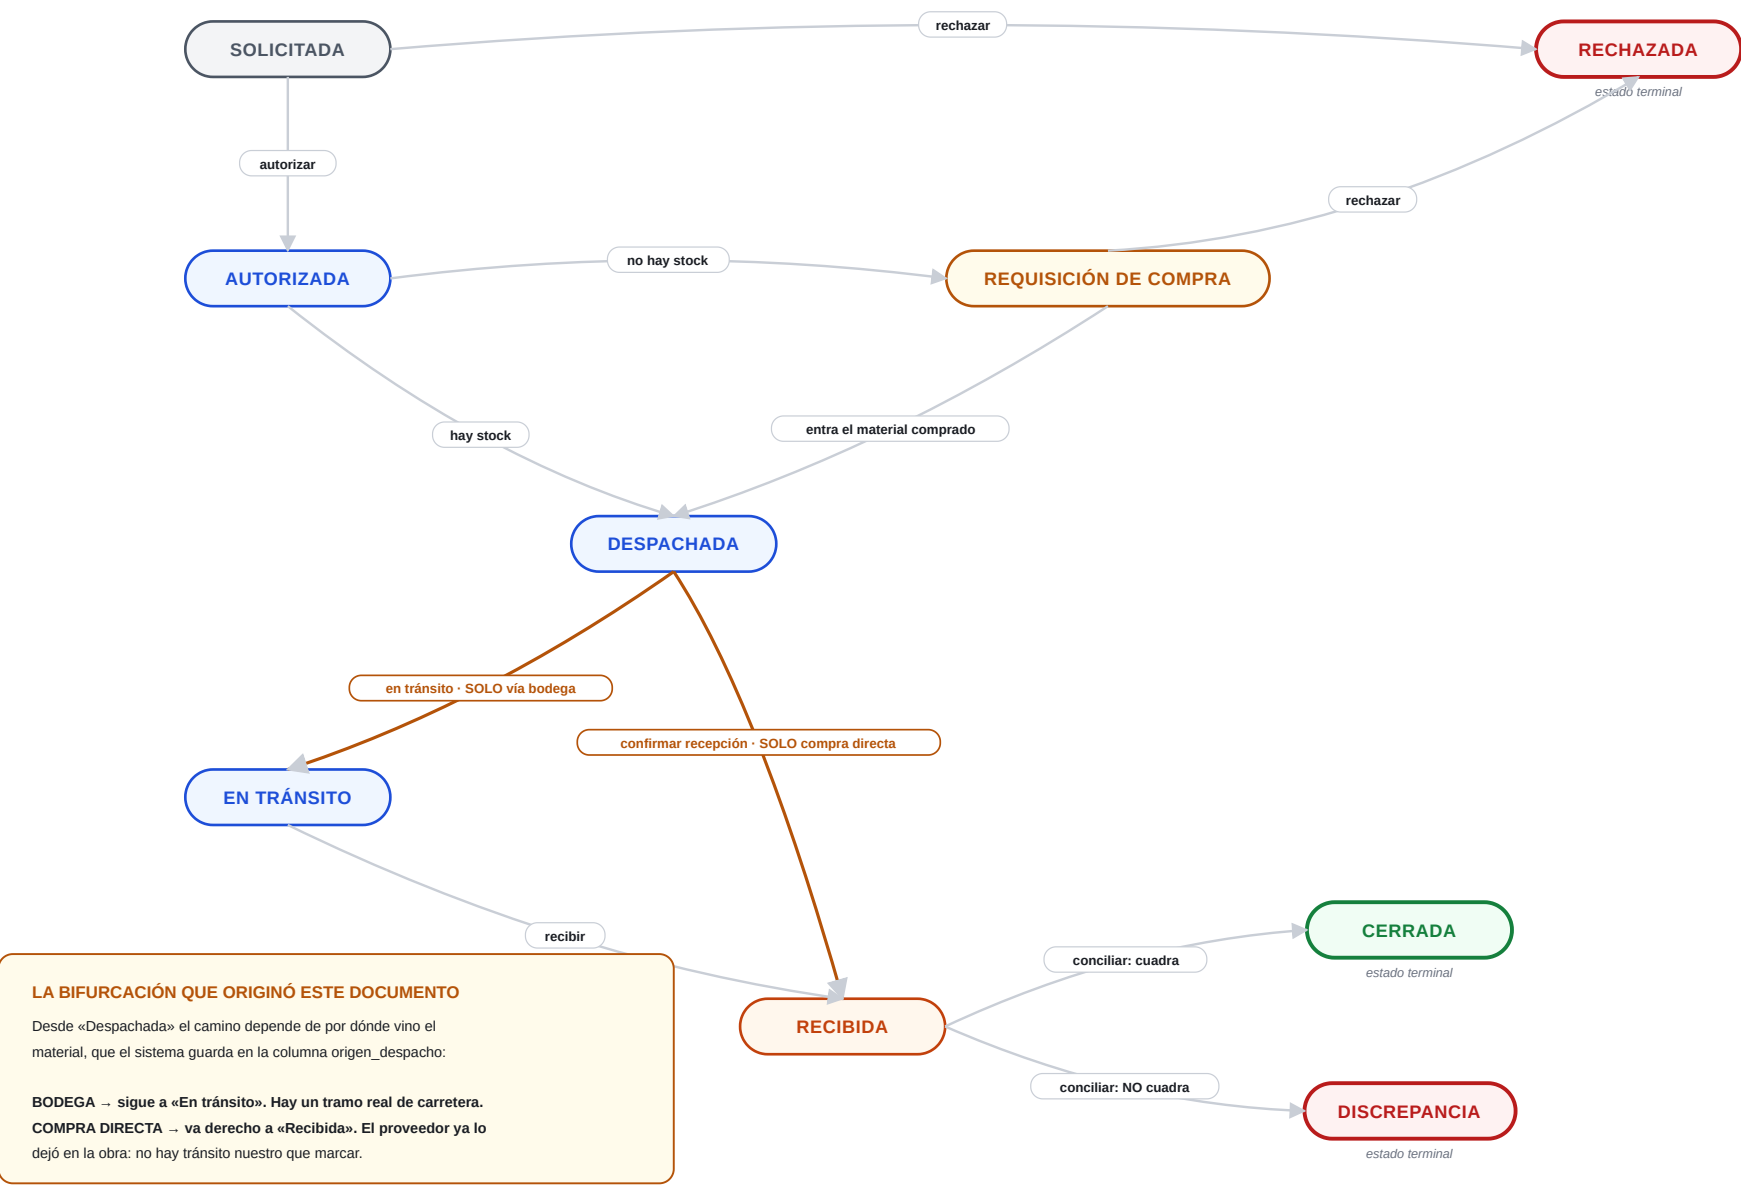


FASE 1 · De la necesidad en obra a la decisión de cómo surtirla

La obra pide · bodega autoriza · el stock parte el camino en dos

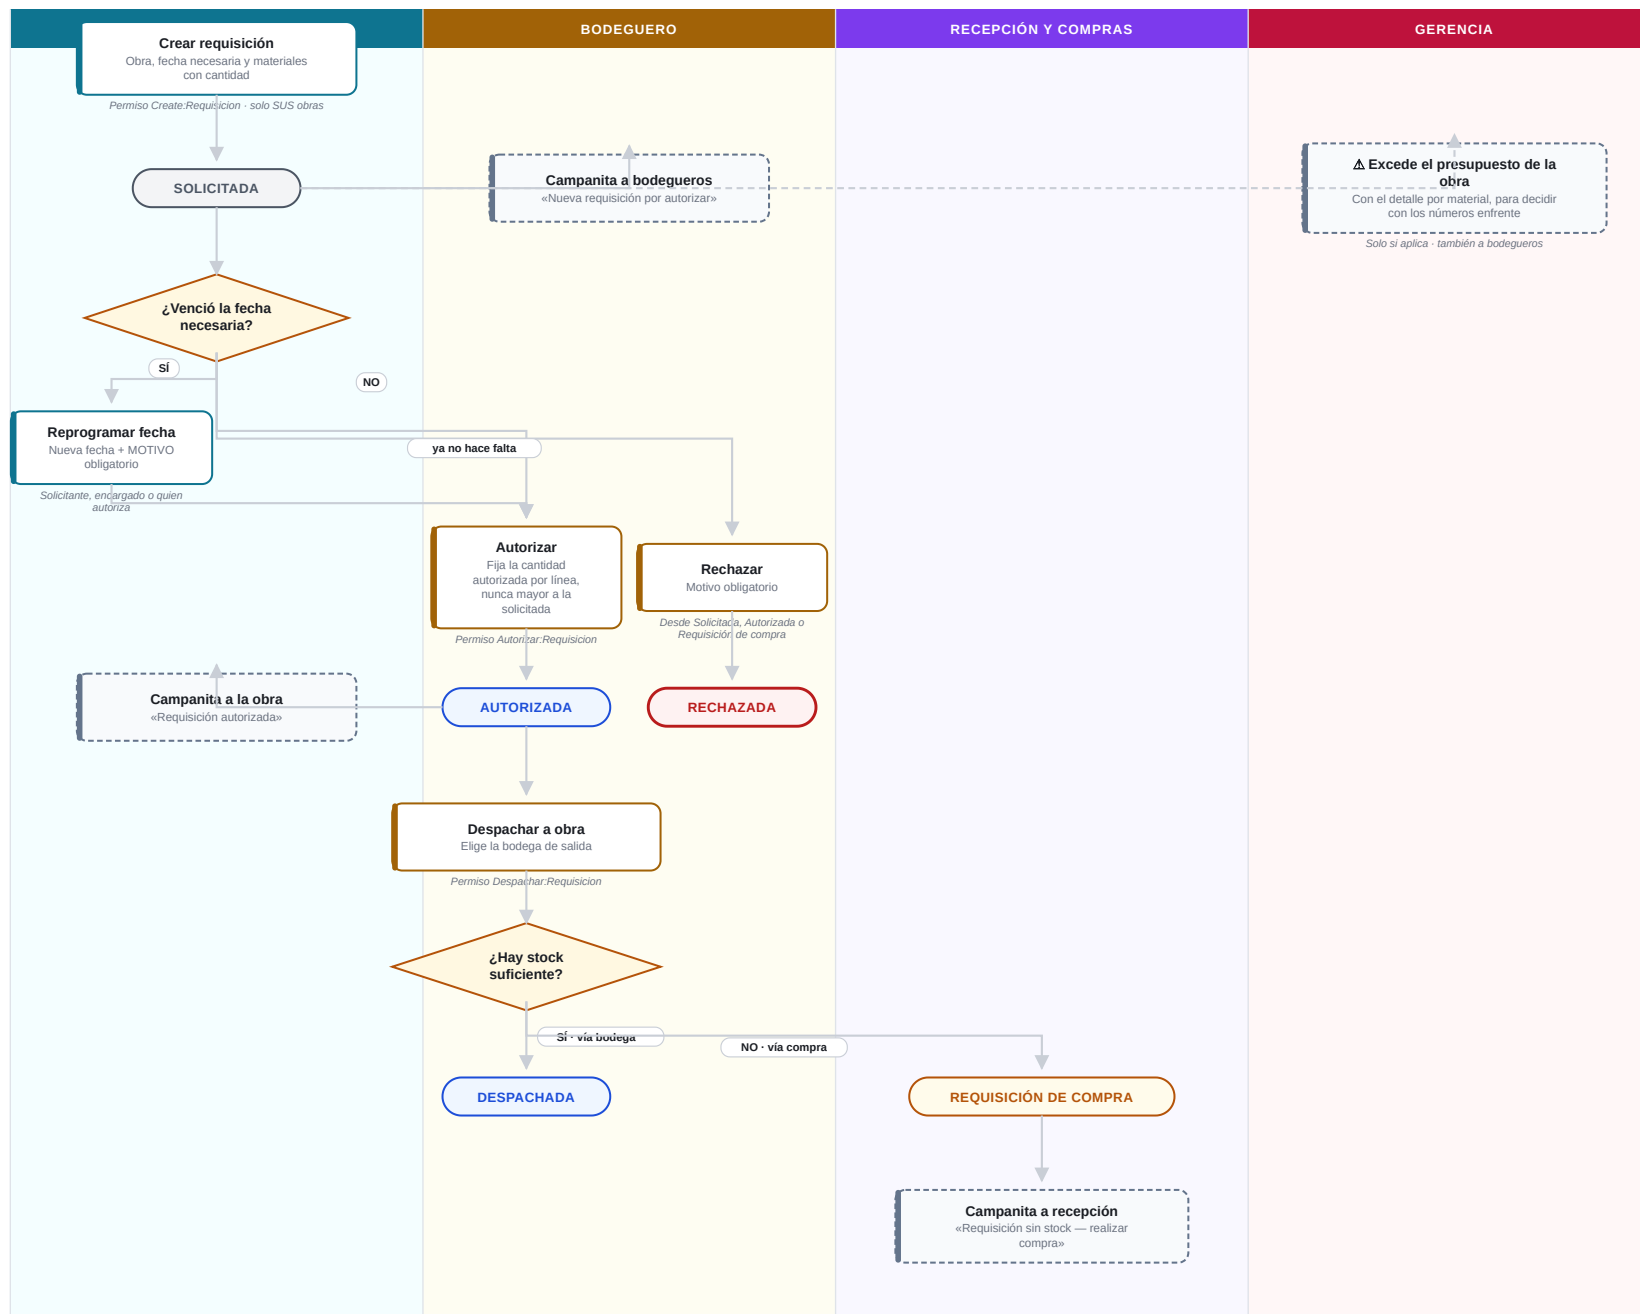


FASE 2A · Vía BODEGA — el material sale de una bodega nuestra

Único camino que pasa por «En tránsito»: hay un tramo real de carretera que registrar

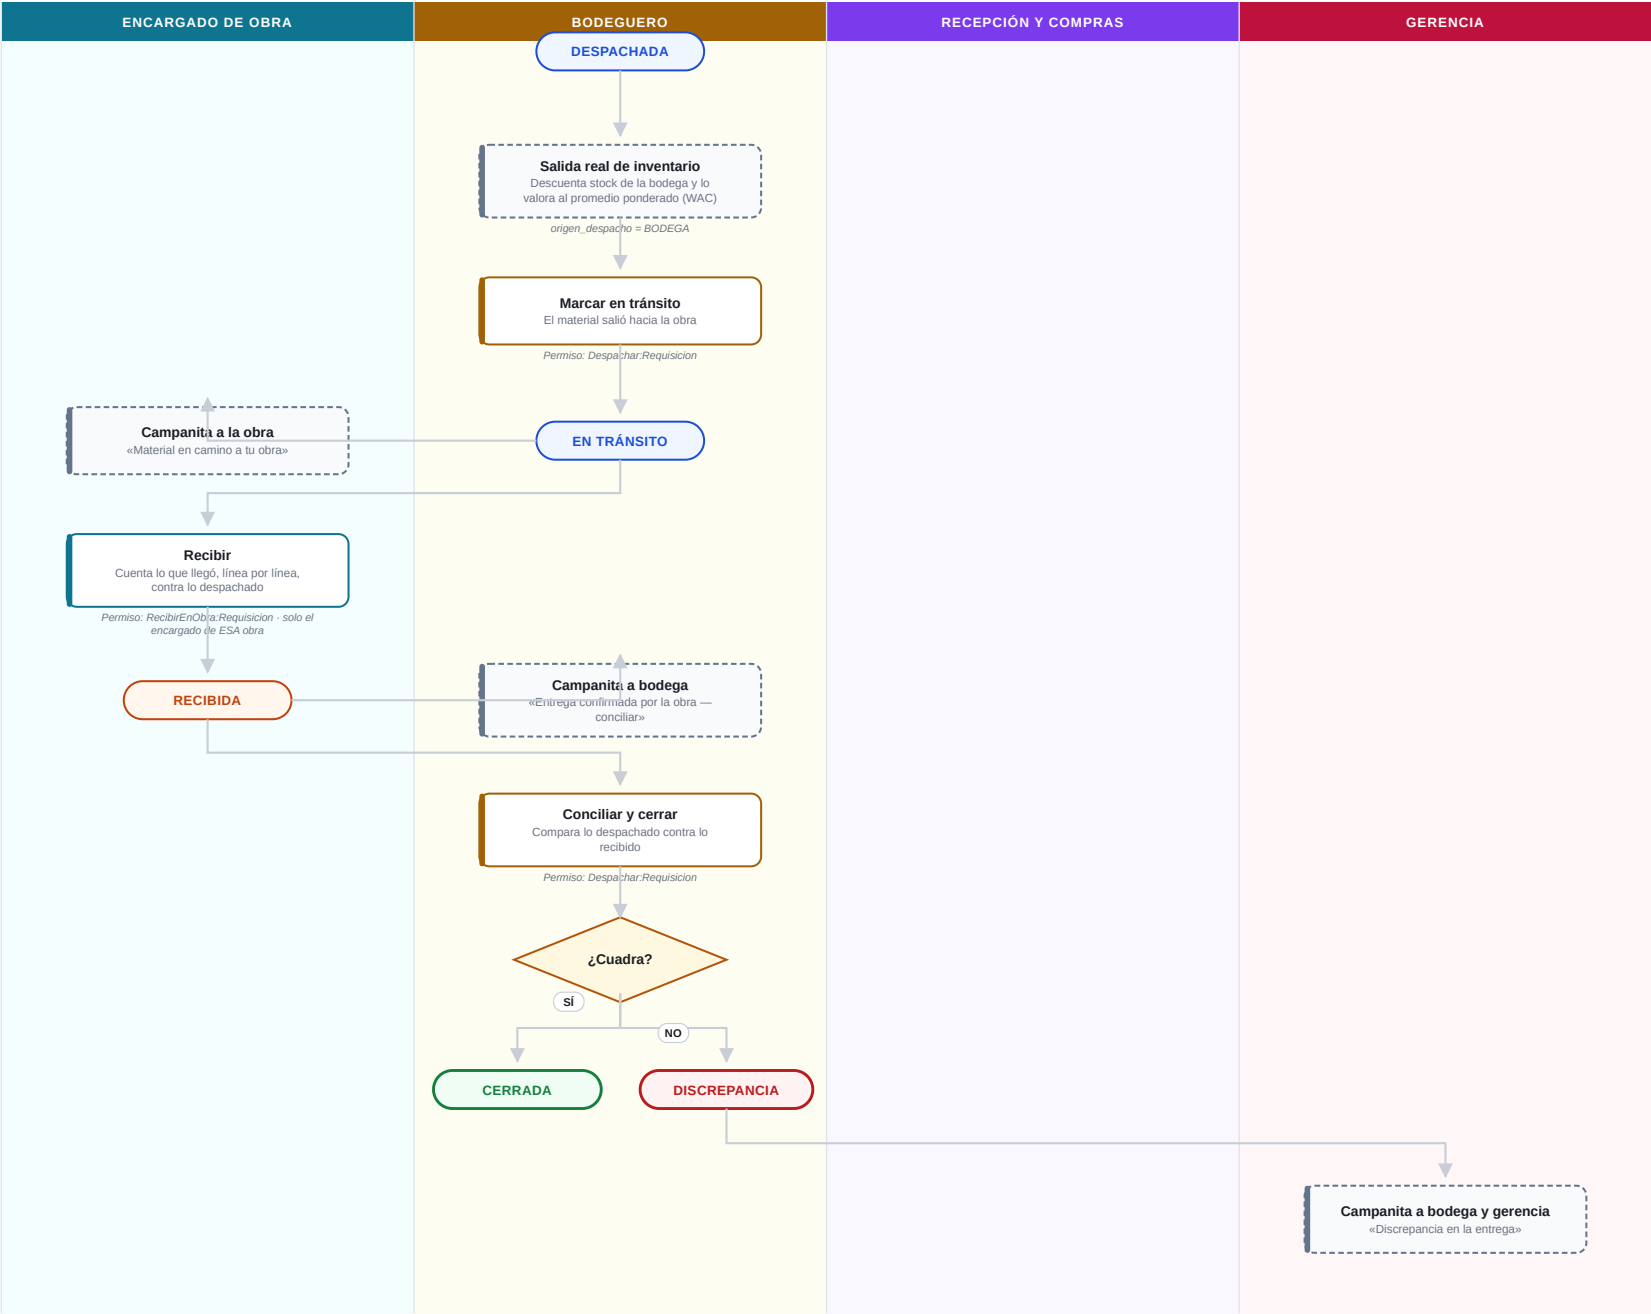

NUNCA pasa por «En tránsito»: el material no salió de ninguna bodega nuestra

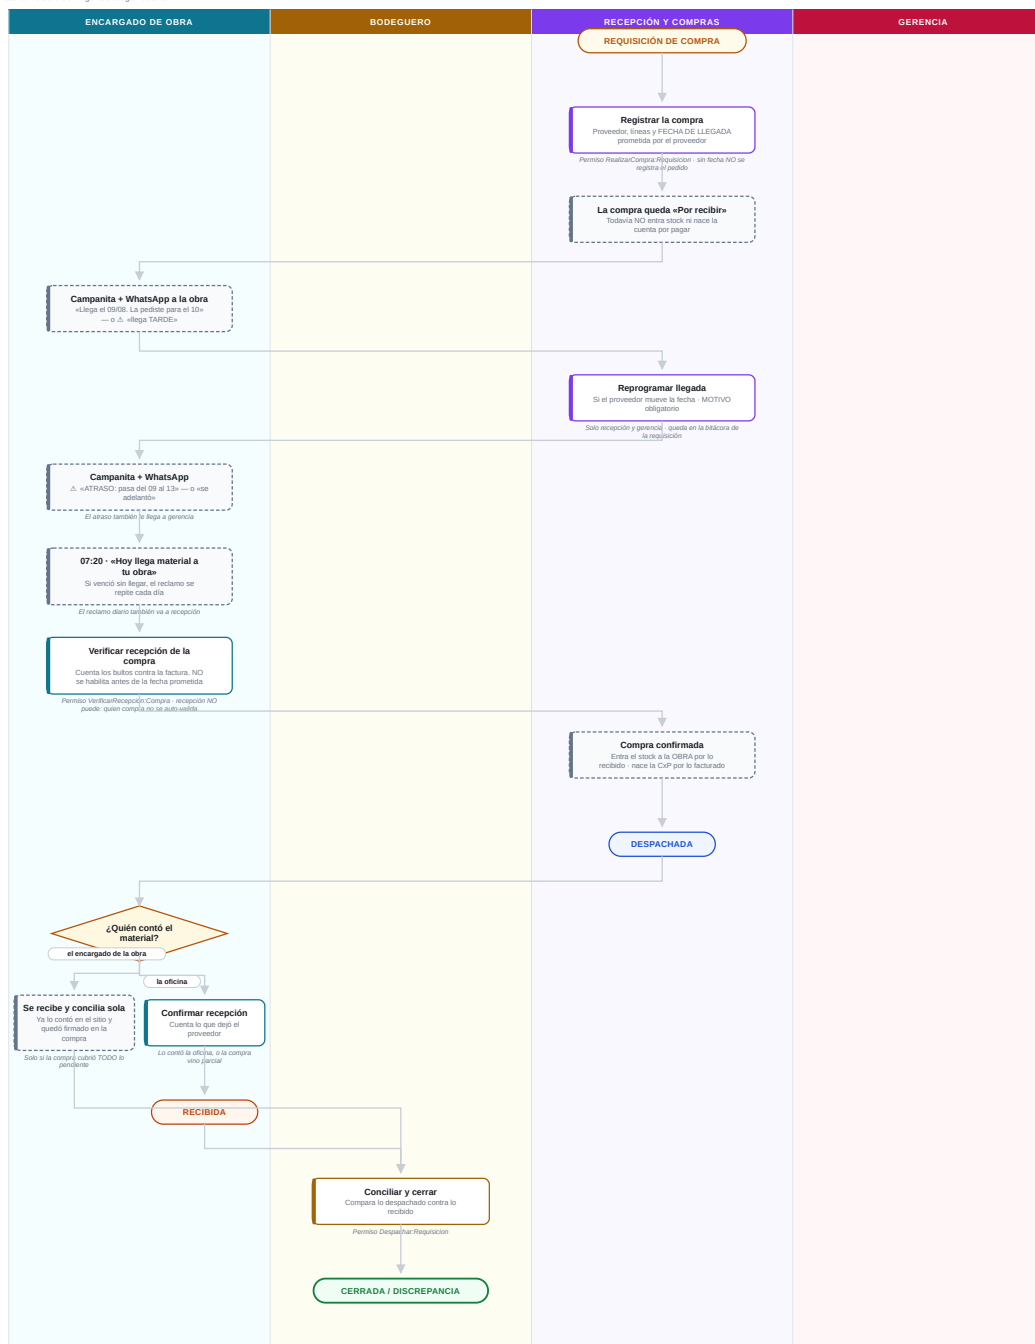

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES · quién puede hacer cada operación

Permisos de fábrica del seeder de roles. Todos son administrables desde Roles → pestaña Personalizados: esta tabla es el punto de partida, no una camisa de fuerza.

OPERACIÓN · PERMISO QUE LA HABILITA	ENCARGADO DE OBRA	BODEGUERO	RECEPCIÓN Y COMPRAS	GERENCIA
Crear la requisición <i>Create:Requisicion</i>	✓ solo SUS obras	✓	✓	✓
Editar líneas y cantidades <i>Update:Requisicion — solo en Solicitada</i>	✓	✓	✓	✓
Reprogramar la fecha necesaria <i>Autorizar:Requisicion, o ser el solicitante o encargado de esa obra</i>	✓ su obra	✓	✓	✓
Autorizar <i>Autorizar:Requisicion</i>	—	✓	✓ comodín	✓
Rechazar <i>Rechazar:Requisicion</i>	—	✓	✓ comodín	✓
Despachar desde bodega <i>Despachar:Requisicion</i>	—	✓	✓ comodín	✓
Marcar en tránsito <i>Despachar:Requisicion — solo vía bodega</i>	—	✓	✓	✓
Registrar la compra <i>RealizarCompra:Requisicion</i>	—	—	✓	✓
Reprogramar la llegada del pedido <i>RealizarCompra:Requisicion — compra «Por recibir»</i>	—	—	✓	✓
Verificar la recepción de la compra <i>VerificarRecepcion:Compra + alcance por destino</i>	✓ su obra	✓ su bodega	NUNCA	✓
Corregir el conteo de la recepción <i>CorregirRecepcion:Compra — dentro de la ventana de corrección (24 h por defecto, configurable)</i>	✓ su obra	✓ su bodega	—	✓
Recibir / Confirmar recepción en obra <i>RecibirEnObra:Requisicion + ser encargado de ESA obra</i>	✓ su obra	—	—	✓
Conciliar y cerrar <i>Despachar:Requisicion</i>	—	✓	✓	✓
Completar (sellar) la compra <i>Completar:Compra</i>	—	—	✓	✓
Anular la compra <i>Anular:Compra</i>	—	—	—	✓ exclusivo

Recepción es el comodín de bodega (decisión del 19/07/2026): cubre autorizar, despachar y rechazar cuando el bodeguero no está. Lo que NUNCA gana es verificar la recepción de una compra — quien compra no se auto-valida — ni anular compras, que queda exclusivo de gerencia.

CATÁLOGO DE ESTADOS · las nueve situaciones posibles

El estado siempre avanza y cada cambio deja responsable, fecha y motivo en la bitácora.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUIÉN TIENE EL SIGUIENTE PASO	DETALLE QUE IMPORTA
SOLICITADA	La obra pidió el material y todavía se puede editar.	Bodeguero: autorizar o rechazar	Único estado que permite editar líneas.
AUTORIZADA	Aprobada, con la cantidad autorizada fijada por línea.	Bodeguero: despachar	La autorizada nunca supera a la solicitada.
REQUISICIÓN DE COMPRA	La bodega no tenía stock: pasa a compras.	Recepción: registrar la compra	Acá vive toda la espera y el seguimiento de llegada.
DESPACHADA	El material va hacia la obra.	Depende del origen del despacho	Vía bodega → tránsito. Compra directa → recepción.
EN TRÁNSITO	Salió de bodega y va en camino.	Encargado: recibir	SOLO existe en la vía bodega.
RECIBIDA	La obra contó lo que llegó.	Bodeguero: conciliar	Se comparan las cantidades despachada y recibida.
CERRADA	Lo recibido cuadró con lo despachado.	Nada — terminal	Cierre limpio del ciclo.
DISCREPANCIA	Lo recibido NO cuadró con lo despachado.	Nada — terminal	Queda la línea y el faltante exacto para reclamar.
RECHAZADA	Se descartó antes de mover material.	Nada — terminal	Exige motivo; se puede desde los tres estados tempranos.

La bifurcación clave está en «Despachada». Si el material salió de una bodega nuestra sigue a «En tránsito»; si lo entregó el proveedor en la obra va derecho a «Recibida». Lo decide la columna *origen_despacho*, y el sistema lo impone: no es una convención, es un bloqueo.

AVISOS AUTOMÁTICOS · quién se entera de qué, y cuándo

El sistema avisa al rol que tiene el siguiente paso. Quien ejecuta la acción nunca se auto-notifica. Las campanitas se envían de forma síncrona: si la operación se revierte, el aviso no sale.

CUÁNDO	A QUIÉN	CANAL	QUÉ DICE
Al crearse la requisición	Bodegueros	Campanita	«Nueva requisición por autorizar»
Si excede el presupuesto de la obra	Gerencia y bodegueros	Campanita	El detalle por material, para decidir con los números enfrente
Al autorizar	Encargados de la obra	Campanita	«Requisición autorizada»
Al quedar sin stock	Recepción	Campanita	«Requisición sin stock — realizar compra»
Al registrar la compra con su fecha	Encargados de la obra	Campanita + WhatsApp	Qué día llega y si eso cae antes o después de la fecha necesaria
Si el proveedor mueve la fecha	Encargados · y gerencia si es atraso	Campanita + WhatsApp	«ATRASO: pasa del 09 al 13» o «se adelantó»
07:20 del día de entrega	Encargados de la obra	Campanita + WhatsApp	«Hoy llega material a tu obra»
Venció la fecha y no llegó (diario)	Encargados y recepción	Campanita	«¿Entregó el proveedor?» — se repite cada día hasta que aparezca
Al marcar en tránsito	Encargados de la obra	Campanita	«Material en camino a tu obra»
Al recibir en obra	Bodegueros	Campanita	«Entrega confirmada por la obra — conciliar»
Al detectarse discrepancia	Bodegueros y gerencia	Campanita	«Discrepancia en la entrega»
Al rechazar	Solicitante y encargados	Campanita	«Requisición rechazada»

Despachada y Cerrada no notifican a nadie: son pasos del mismo actor que ya está en pantalla. Una campanita que suena por todo termina ignorada.

REGLAS DURAS DEL FLUJO · lo que el sistema no deja hacer

Cada una está validada en el servicio, no solo escondida en la pantalla: esconder un botón evita el error accidental, el guard evita el error a secas.

- 1 El estado solo avanza**
La máquina de estados no admite marcha atrás. La única excepción la produce anular la compra que surtió la requisición: entonces vuelve a «Requisición de compra» y queda anotado por qué.
- 2 Una requisición vencida no se autoriza**
Si la fecha necesaria ya pasó, hay que reprogramarla con motivo o rechazarla. Autorizar un pedido vencido despacharía material que la obra quizá ya resolvió por otro lado.
- 3 La compra directa nunca pasa por «En tránsito»**
El material no salió de ninguna bodega nuestra: lo dejó el proveedor en el sitio. El sistema esconde el botón Y lo rechaza en el servicio, no solo en la pantalla.
- 4 Sin fecha de llegada no se registra el pedido**
En una entrega directa a obra nacida de una requisición, la fecha prometida por el proveedor es obligatoria: es lo único que le permite a la obra saber qué día estar pendiente.
- 5 No se verifica la recepción antes del día prometido**
Verificar mete el stock a la obra y crea la cuenta por pagar. Hacerlo antes sería inventario fantasma y deuda por algo que no llegó. Si el proveedor se adelanta, recepción reprograma la fecha.
- 6 Quien compra no valida su propia compra**
Recepción registra el pedido pero NUNCA verifica lo que llegó. Cuenta los bultos quien los recibe: el bodeguero en su bodega, el encargado en su obra. Gerencia es el respaldo.
- 7 La obra confirma sobre SUS obras**
El alcance no lo dan solo los permisos: recibir exige además ser encargado de ese proyecto. Gerencia y administración son el único pase universal.
- 8 Nadie cuenta el mismo material dos veces**
Si quien verificó la compra es el encargado de la obra y el pedido cubrió todo lo pendiente, la requisición se recibe y concilia sola. Si lo contó la oficina, o vino parcial, la obra confirma.
- 9 Todo movimiento deja responsable y motivo**
Cada transición escribe un renglón en la bitácora con quién, cuándo y desde qué estado. Rechazar, reprogramar la fecha y reprogramar la llegada exigen motivo escrito.
- 10 El despacho mueve stock real**
La salida de bodega descuenta existencias y las valora al promedio ponderado (WAC). En la compra directa el stock entra a la obra al costo real de factura, sin pasar por bodega.

Punto abierto, decidido a conciencia: reprogramar la llegada de un pedido queda solo en recepción y gerencia. Si el proveedor se adelanta, el encargado no puede recibir hasta que la oficina mueva la fecha. Se aceptó el costo a cambio de que la fecha prometida solo la toque quien la pactó con el proveedor.
